


ANNEXE COMPLEMENTAIRE : SCHEMA SYNTHETIQUE DE PHASAGE DES TRAVAUX


CINÉMATIQUE TRAVAUX – AMIENS-NORD (1/2)

PHASE 0

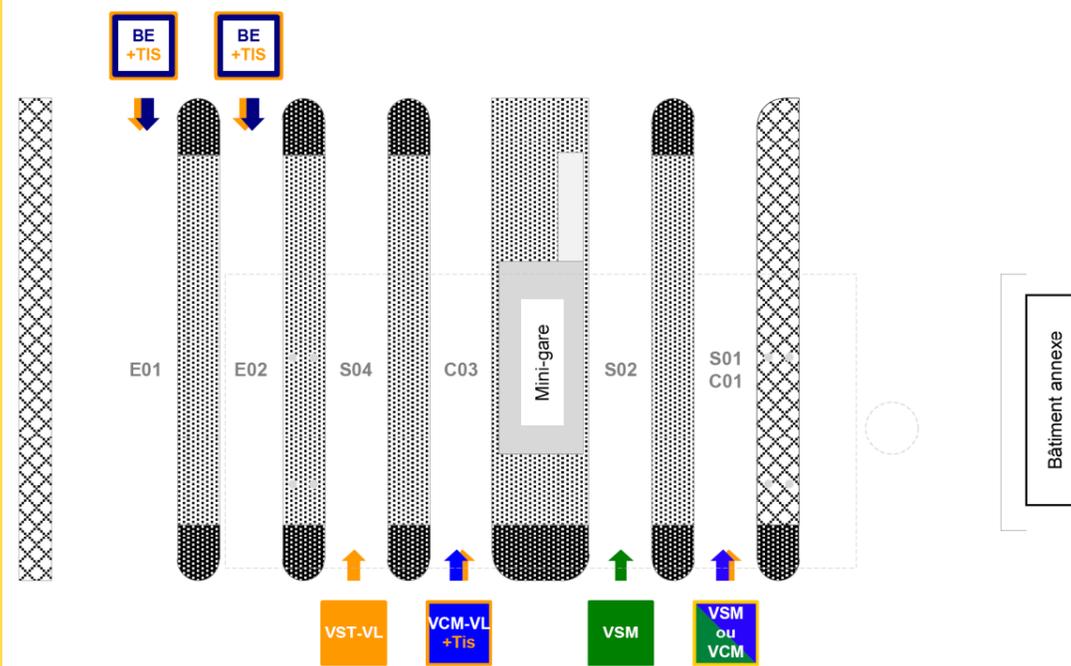


Travaux préparatoires

PHASE 2

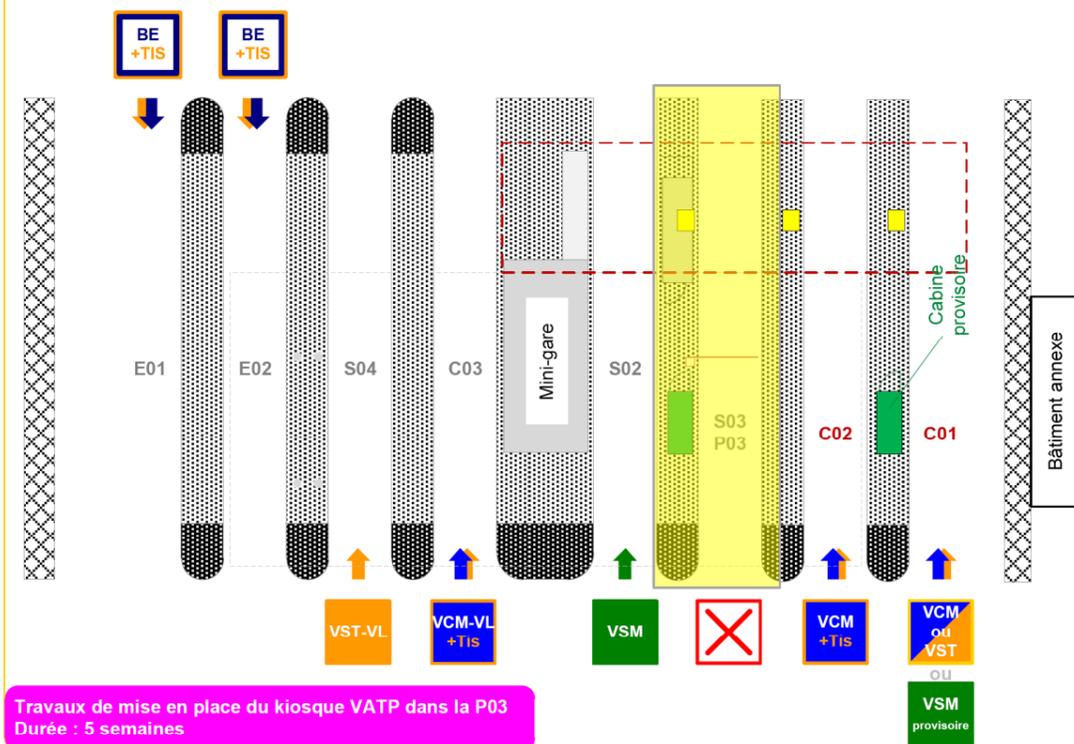


Travaux de mise en place du kiosque VATP dans la P03
Durée : 5 semaines

PHASE 1

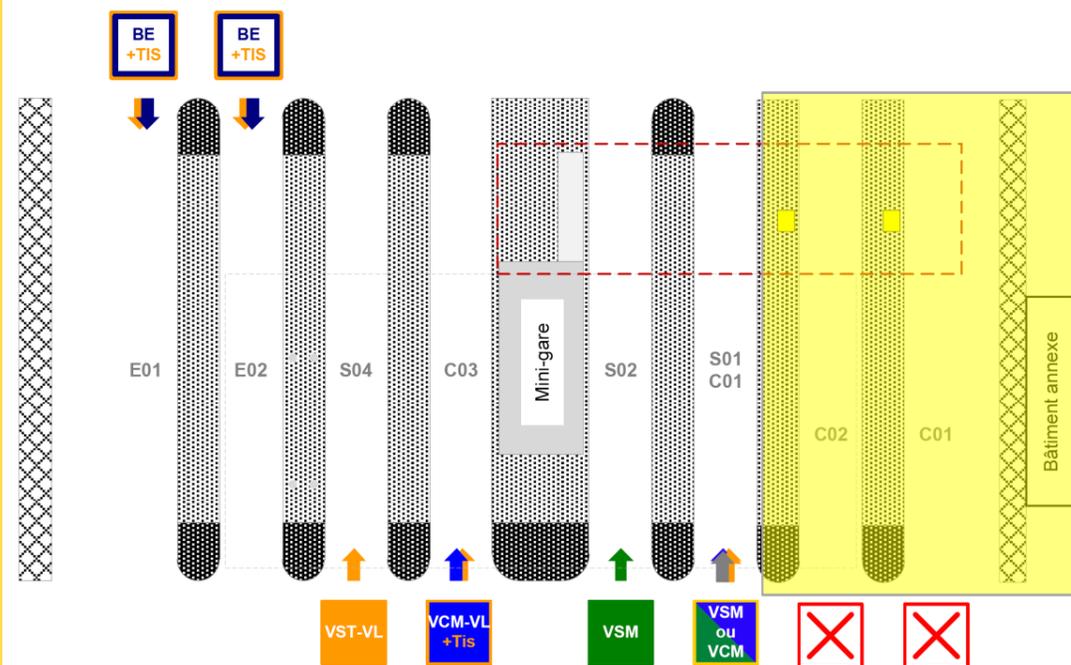

Travaux d'extension des 2 voies de droite
+ Extension d'auvent
Durée : 22 semaines (5,5 mois)


PHASE 3 – AUTOMATISABLE EN P3

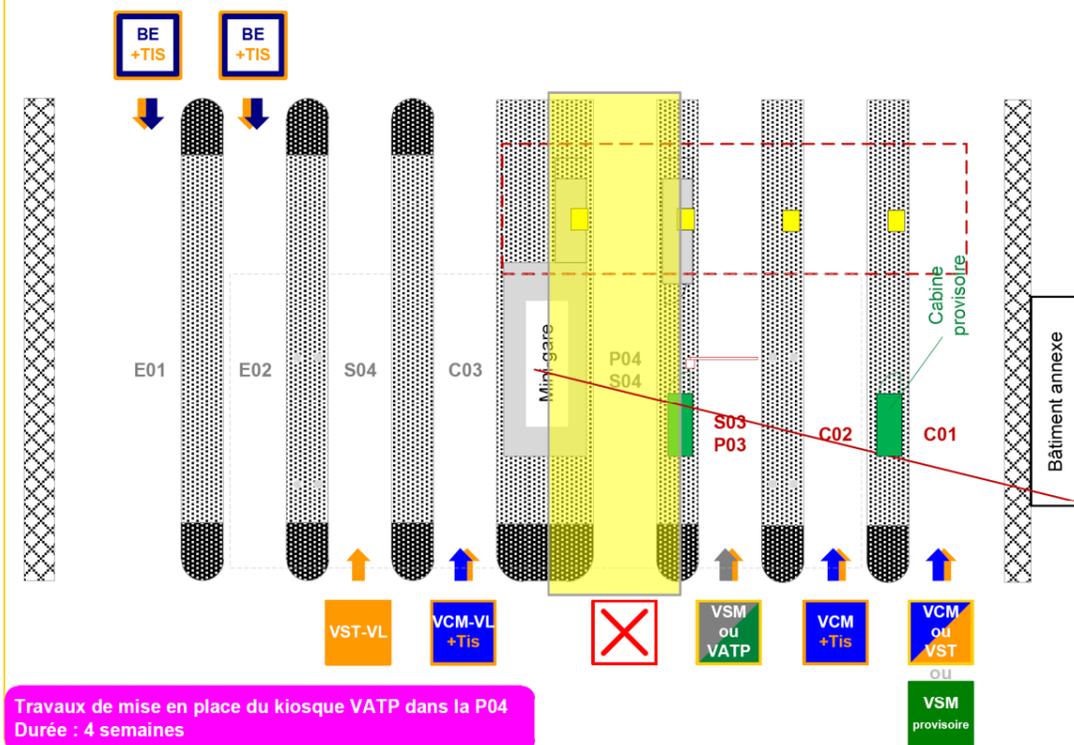

Travaux de mise en place du kiosque VATP dans la P04
Durée : 4 semaines


Préconisations particulières :

- Phase 3 :
 - Le billettage et le ramassage de fonds sont effectués dans le kiosque VATP
 - Le kiosque VATP sera utilisé en tant que local d'assistance site des voies automatiques.
 - Un coffre anti-pêche sera installé provisoirement dans le kiosque VATP

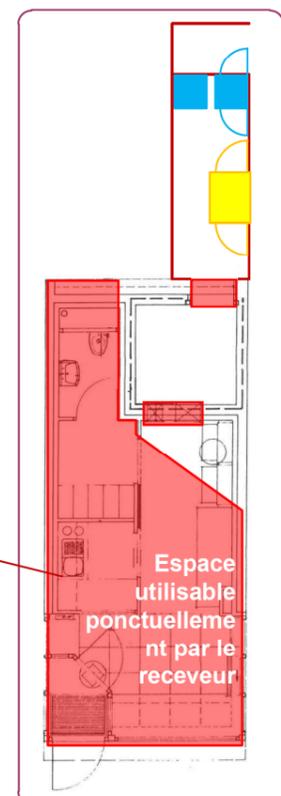


CINÉMATIQUE TRAVAUX – AMIENS-NORD (2/2)

PHASE 4 – AUTOMATISABLE EN P3

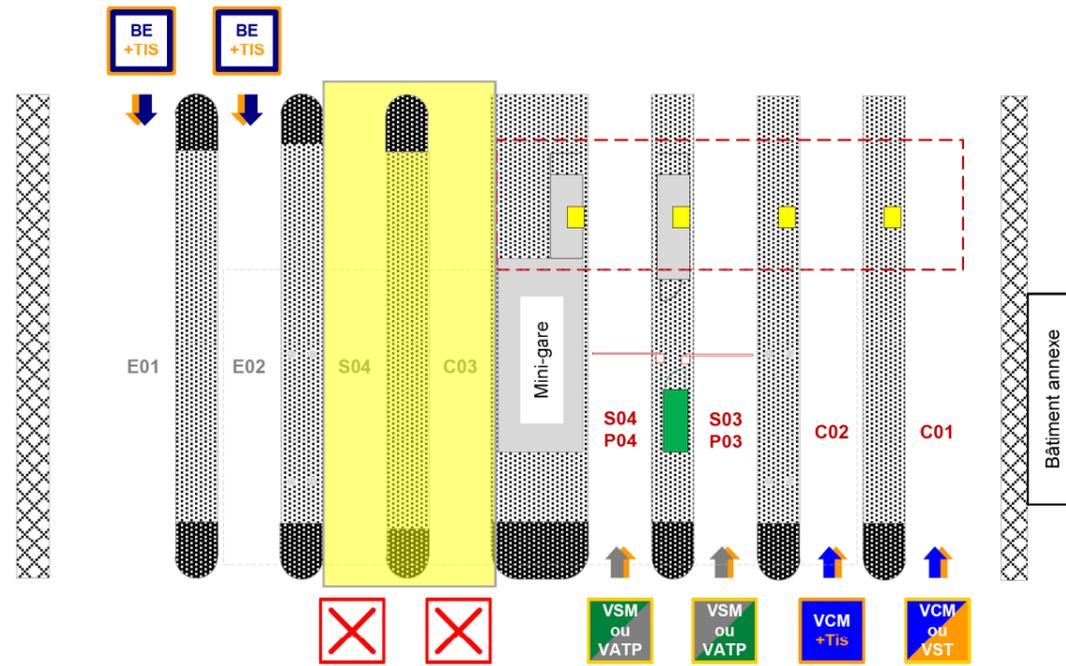


Travaux dans les futures voies E03 et C05
Durée : 2 semaines

PHASE 6 – AUTOMATISABLE HORS HP

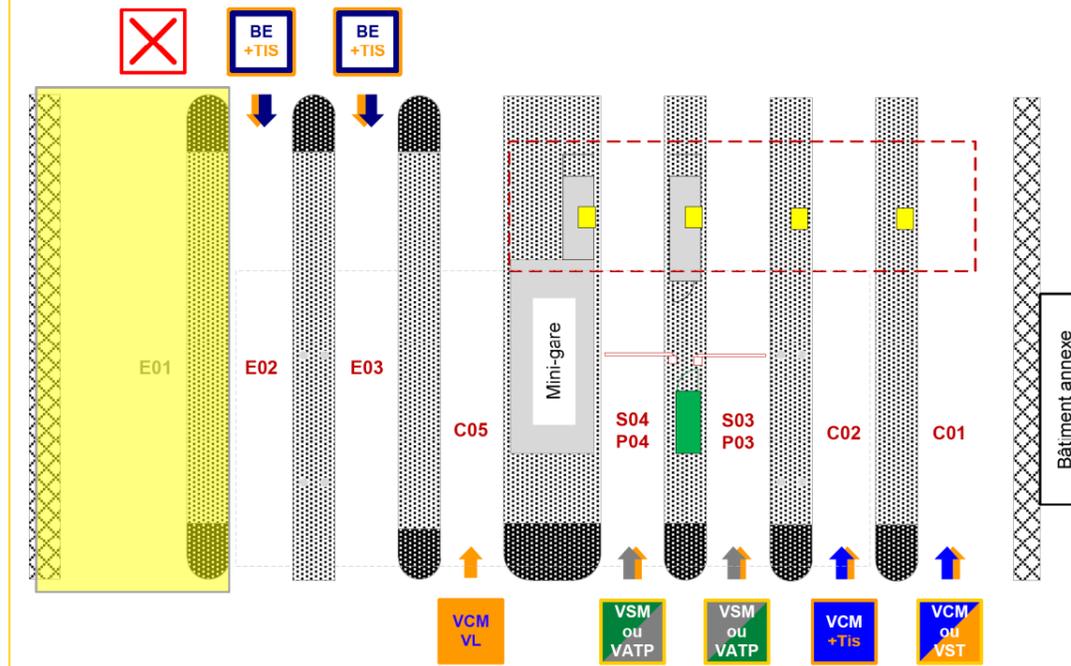


Travaux dans la future voie E01
+ Travaux de finition divers
Durée : 2 semaines

PHASE 5 – AUTOMATISABLE HORS HP

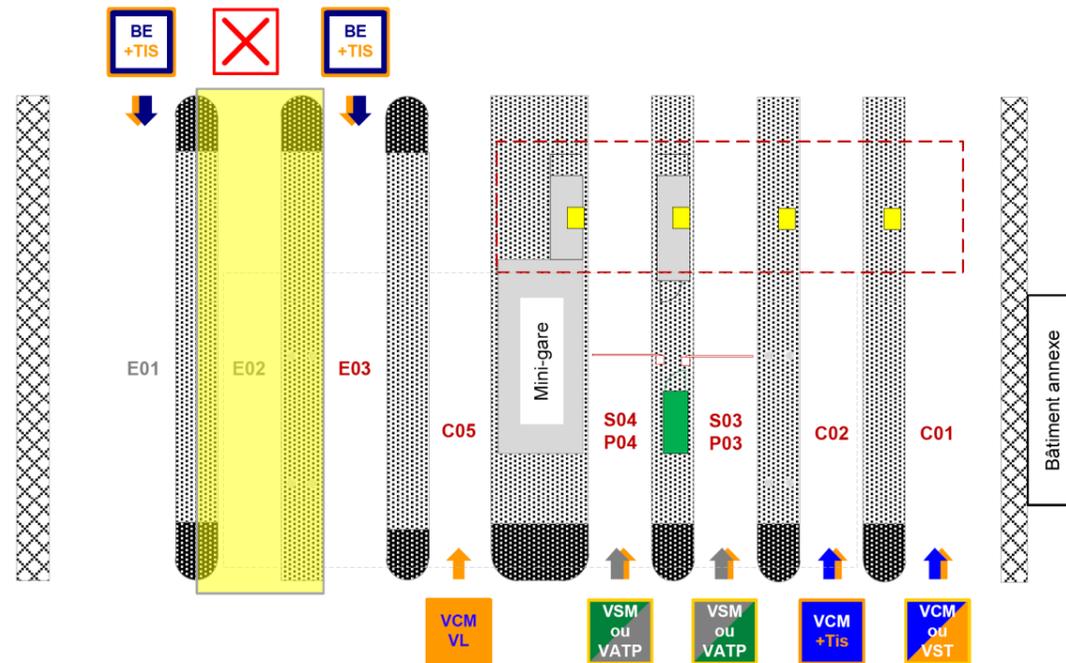

Travaux dans la future voie E02
Durée : 1 semaine

PHASE FINALE

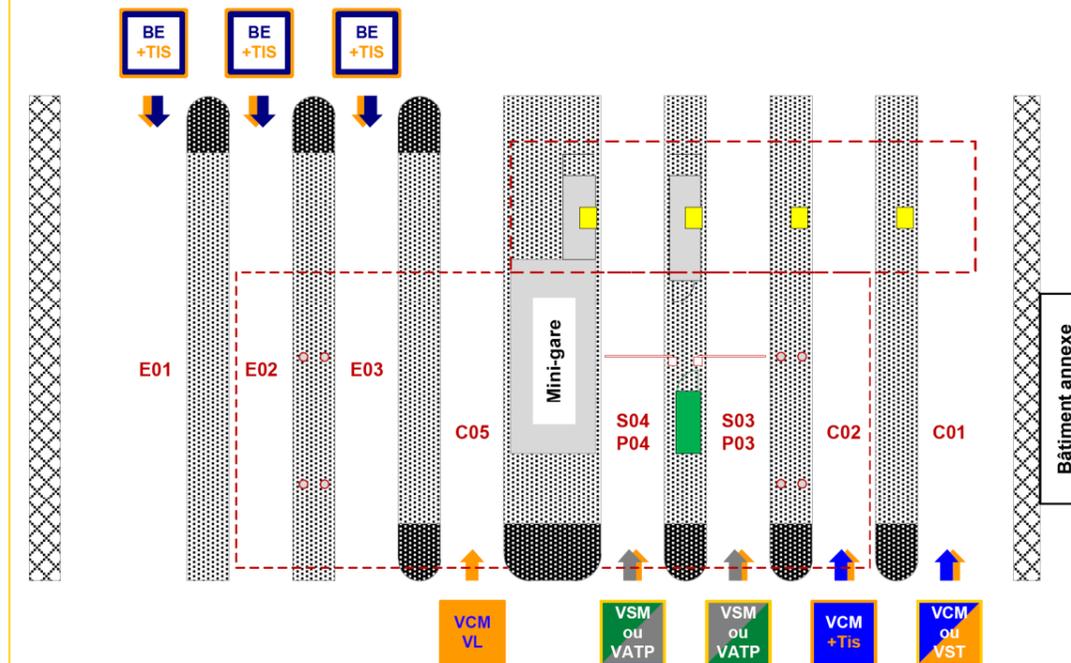

Durée totale (+ préparation) : 36 semaines (9 mois)
